




Tendance sur les affluents	
Garonne pyrénéenne <i>Tarrissement</i>	↗
Salat <i>Tarrissement</i>	↗
Ariège <i>Hydroélectricité</i>	↗
Tarn/Aveyron <i>Tarrissement</i>	→
Lot <i>Hydroélectricité</i>	↗
Affluents Gascons <i>Fluctuations</i>	↗

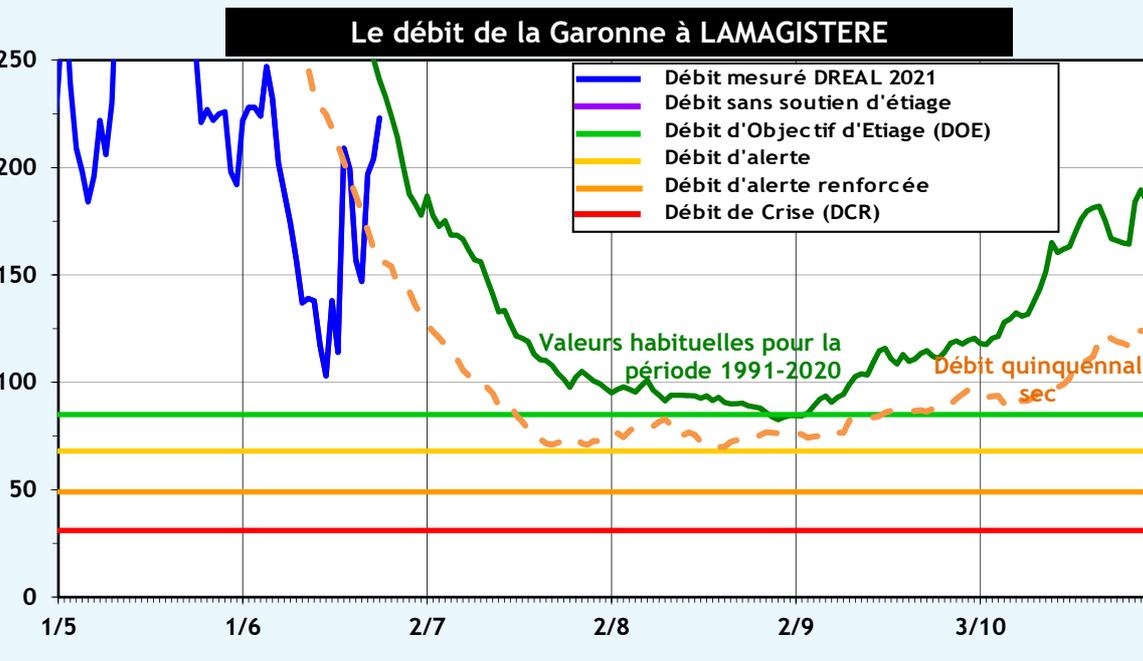

Ressources
Le Sméag dispose en 2021 de plusieurs réserves pour réalimenter la Garonne :
1- Par l'Ariège (IGLS + Naguilhes) : 53.23 hm³
2- Par la Garonne amont (lac d'Oô) : 8.39 hm³
3- Par l'Arize (Filhet) : 1 hm³
4- Par l'Ariège via l'Hers Vif (Montbel) : 2 hm³ (15/09)
5- Par le Tarn via le Thoré (Saints-Peyres) : 2.5 hm³
6- Par le Tarn via l'Agout (Raviège) : 6 hm³ (21/09)
Total restant : 73.1 hm³
Volume consommé : 0.0 hm³

Lancement de la campagne 2021 avec des moyens renforcés

Le Sméag, aux côtés de ses partenaires, assure à nouveau la responsabilité du soutien d'étiage de la Garonne. Il dispose jusqu'au 31 octobre d'un volume en augmentation de 78,12 millions de mètres cubes (72 hm³). Au 1er juillet : 48 hm³ sur les lacs ariègeois (Izourt, Gnioure, Laparan, Soulcem, Naguilhes) ; 1 hm³ sur la rivière Arize en amont de Toulouse (Filhet) ; 2,5 hm³ sur le Thoré-Agout (Saints-Peyres). Au 1er septembre : 8 hm³ sur Oô. Au 15 septembre : jusqu'à 7 hm³ (non garantis) depuis le lac de Montbel. Au 21 septembre : 6 hm³ sur l'Agout (La Raviège). Le nouveau contrat de coopération a permis de doubler la capacité en débit sur la période allant de la mi-août à la mi-septembre. Ces moyens sont renforcés par deux Protocoles d'accord inter bassins traduisant la solidarité entre la Garonne et ses affluents.

La tendance hydrologique, hors épisodes de crues, est au sec en cette fin juin : entre les quinquennales et décennales sèches, la situation étant plus tendue en amont. La fonte des neiges est terminée depuis le 10 juin, les nappes d'accompagnement sont à des niveaux moyens. Ce contexte fait présager une entrée en étiage précoce depuis l'aval du Tarn à Lamagistère. Cette année les objectifs fixés par le Comité stratégique du 14 mai 2021 sont les suivants. En juillet-août : viser un débit autour de 80-90 % du DOE à Lamagistère. En juillet-août-septembre-octobre : tenir le DOE de Portet (48-52 m³/s). En septembre-octobre : viser les 18 m³/s du projet de DOE révisé à Valentine. De juillet à octobre : tenir le seuil d'alerte à Tonneins et éviter le seuil d'Alerte à Marquefave (20 m³/s).
